



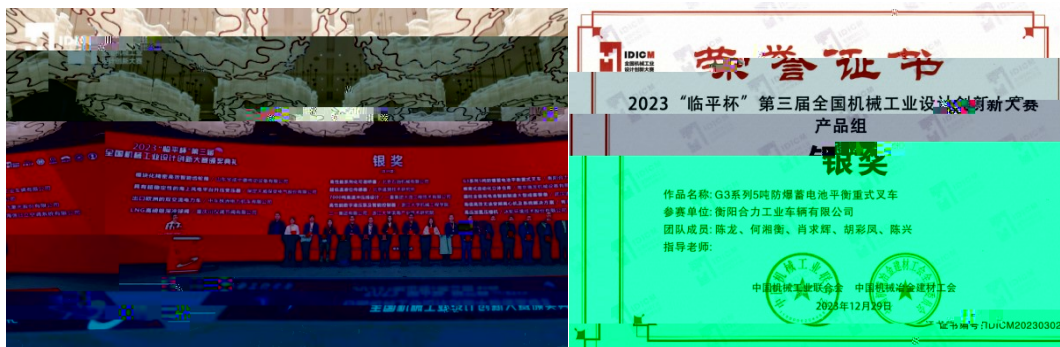


HELI

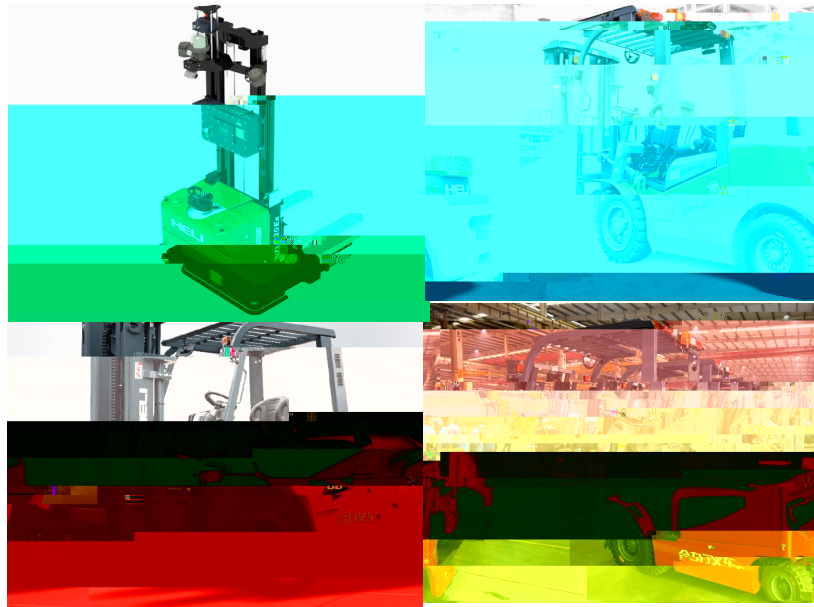

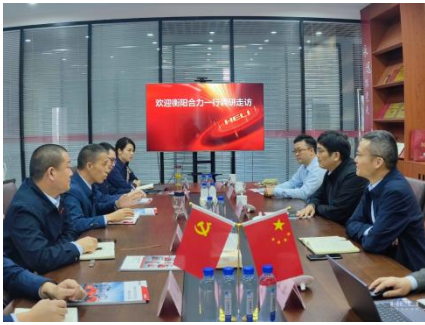

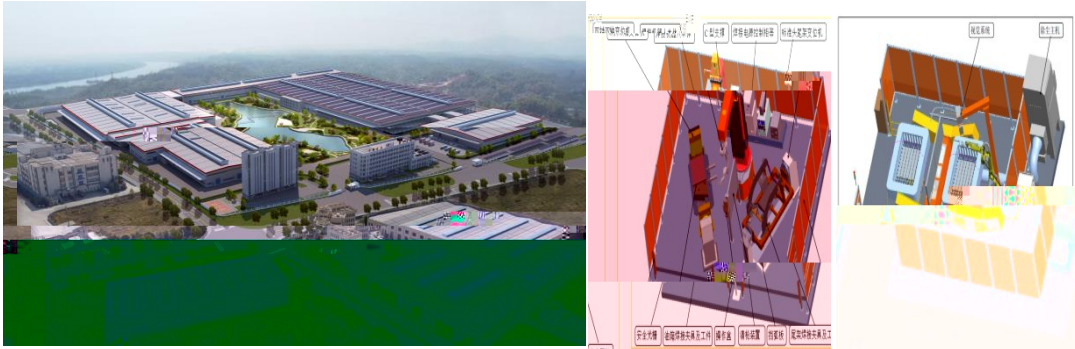









生产现场危险源辨识评价表

序号	危险源	危险源类型	危险源等级	危险源描述	危险源控制措施
1	起重机械	机械伤害	高风险	起重机械作业时，人员靠近或进入危险区域，可能导致人员伤亡。	1. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 2. 作业时，必须设置警戒线，禁止无关人员靠近。 3. 定期检查起重机械的安全装置，确保其完好有效。
2	电气线路	触电伤害	中风险	电气线路老化、破损，可能导致触电事故。	1. 定期检查电气线路，及时更换老化、破损的线路。 2. 严禁私拉乱接电线。 3. 作业人员必须穿戴绝缘防护用品。
3	高处作业	坠落伤害	高风险	高处作业时，作业人员未系安全带，可能导致坠落事故。	1. 高处作业时，必须系好安全带，并挂在牢固的物体上。 2. 作业人员必须经过高处作业培训，持证上岗。 3. 定期检查高处作业平台、脚手架的安全设施。
4	有限空间作业	中毒窒息	高风险	有限空间作业时，作业人员未进行气体检测，可能导致中毒窒息事故。	1. 有限空间作业时，必须先进行气体检测，合格后方可进入。 2. 作业人员必须佩戴防毒面具、氧气呼吸器等防护用品。 3. 有限空间作业时，必须有专人监护，严禁单独作业。
5	物体打击	物体打击	中风险	作业时，工具、材料等从高处坠落，可能导致物体打击事故。	1. 作业时，工具、材料应放置牢固，严禁随意堆放。 2. 作业人员应穿戴安全帽。 3. 定期检查作业现场的安全设施。
6	火灾爆炸	火灾爆炸	高风险	作业时，使用明火，可能导致火灾爆炸事故。	1. 作业时，严禁使用明火。 2. 作业时，应配备消防器材，并确保其完好有效。 3. 定期检查作业现场的安全设施。
7	车辆伤害	车辆伤害	中风险	作业时，车辆行驶，可能导致车辆伤害事故。	1. 作业时，车辆应限速行驶。 2. 作业人员应穿戴反光背心。 3. 定期检查车辆的安全设施。
8	机械伤害	机械伤害	中风险	作业时，机械运转，可能导致机械伤害事故。	1. 作业时，应设置安全警示标志。 2. 作业人员应穿戴防护用品。 3. 定期检查机械的安全设施。
9	起重伤害	起重伤害	高风险	起重作业时，起重物坠落，可能导致起重伤害事故。	1. 起重作业时，必须设置警戒线，禁止无关人员靠近。 2. 作业人员必须经过专业培训，持证上岗。 3. 定期检查起重机械的安全装置。
10	触电伤害	触电伤害	中风险	作业时，接触带电体，可能导致触电伤害事故。	1. 作业时，必须穿戴绝缘防护用品。 2. 作业人员必须经过电气作业培训，持证上岗。 3. 定期检查电气线路的安全设施。



